


CLAPET DÉLUGE FIRELOCK NXTMC SÉRIE 769

SYSTÈME DE DÉCLENCHEMENT ÉLECTRIQUE AVEC UNE ÉLECTROVANNE SÉRIE 753-E




NOTE : CE TABLEAU MURAL SERT DE GUIDE LORS DE LA MISE EN SERVICE DU SYSTÈME ET DES ESSAIS D'ALARME D'ÉCOULEMENT D'EAU.

POUR DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES, TOUJOURS SE REPORTER AU MANUEL D'INSTALLATION, ENTRETIEN ET ESSAIS.

MISE EN SERVICE DU SYSTÈME

- Ouvrir le robinet de vidange principal du système (repère 18). Vérifier que le système est vidangé.
- Fermer le robinet de vidange principal du système (repère 18).
- S'assurer que les points de drainage du système sont fermés et qu'il n'y a pas de fuite.
- Vérifier que le système n'est plus sous pression. Les manomètres doivent indiquer une pression nulle.
- Ouvrir le robinet à tournant sphérique sur la conduite de mise en charge de membrane (repère 8).
- Vérifier que de l'eau s'écoule régulièrement par la vidange automatique (repère 13).
- Fermer le robinet à tournant sphérique sur la conduite de mise en charge de membrane (repère 8).
- Vérifier que l'électrovanne (repère 20) est fermée.
- Vérifier que le robinet à tournant sphérique pour essai d'alarme (repère 11) est fermé.
- Ouvrir le robinet à tournant sphérique sur la conduite de mise en charge de membrane (repère 8). Laisser l'eau s'écouler par le tuyau de vidange automatique (repère 13).
- S'assurer qu'il n'y a pas d'écoulement d'eau par l'électrovanne (repère 20).
- Ouvrir l'avertisseur d'incendie (repère 19) pour purger l'air éventuellement présent.
- Fermer l'avertisseur d'incendie (repère 19).
- En tirant, lever le manchon de vidange automatique (repère 13) jusqu'à ce que la vis soit en position « réglée » (« UP [haut] »). Vérifier que le manomètre (repère 12) sur la conduite de mise en charge de membrane indique une pression.
- Lorsque la conduite de mise en charge de la membrane est sous pression, fermer temporairement le robinet à tournant sphérique (repère 8) sur cette conduite. Vérifier que la pression se maintient dans la conduite de mise en charge de la membrane au moyen du manomètre (repère 12) sur cette conduite.
- Si la pression diminue dans la conduite de mise en charge de la membrane, cette membrane doit être remplacée et/ou les fuites éventuelles dans la conduite doivent être réparées.
- Si la pression ne diminue pas dans la conduite de mise en charge de la membrane, rouvrir le robinet à tournant sphérique (repère 8) sur cette conduite et passer à l'étape suivante.
- Ouvrir le robinet de vidange principal de la conduite d'alimentation en eau (repère 14).
- Ouvrir doucement le robinet principal d'alimentation en eau (repère 3) jusqu'à ce que l'écoulement par le robinet de vidange principal (ouvert) de la conduite d'alimentation se soit stabilisé.
- Une fois l'écoulement d'eau stabilisé, fermer le robinet de vidange principal de la conduite d'alimentation en eau (repère 14).
- Vérifier que la chambre intermédiaire du clapet ne fuit pas. Il ne doit pas y avoir de fuite par le clapet de non-retour d'égouttage (repère 7) sur la conduite d'alarme.
- Si de l'eau s'écoule par le clapet de non-retour d'égouttage (repère 7), fermer le robinet principal d'alimentation en eau (repère 3) et reprendre à l'étape 1.
- Ouvrir à fond le robinet principal d'alimentation en eau (repère 3).
- Enregistrer la pression d'alimentation en eau.
- S'assurer que les robinets se trouvent dans leur position normale de service (se reporter au tableau dans la colonne suivante).

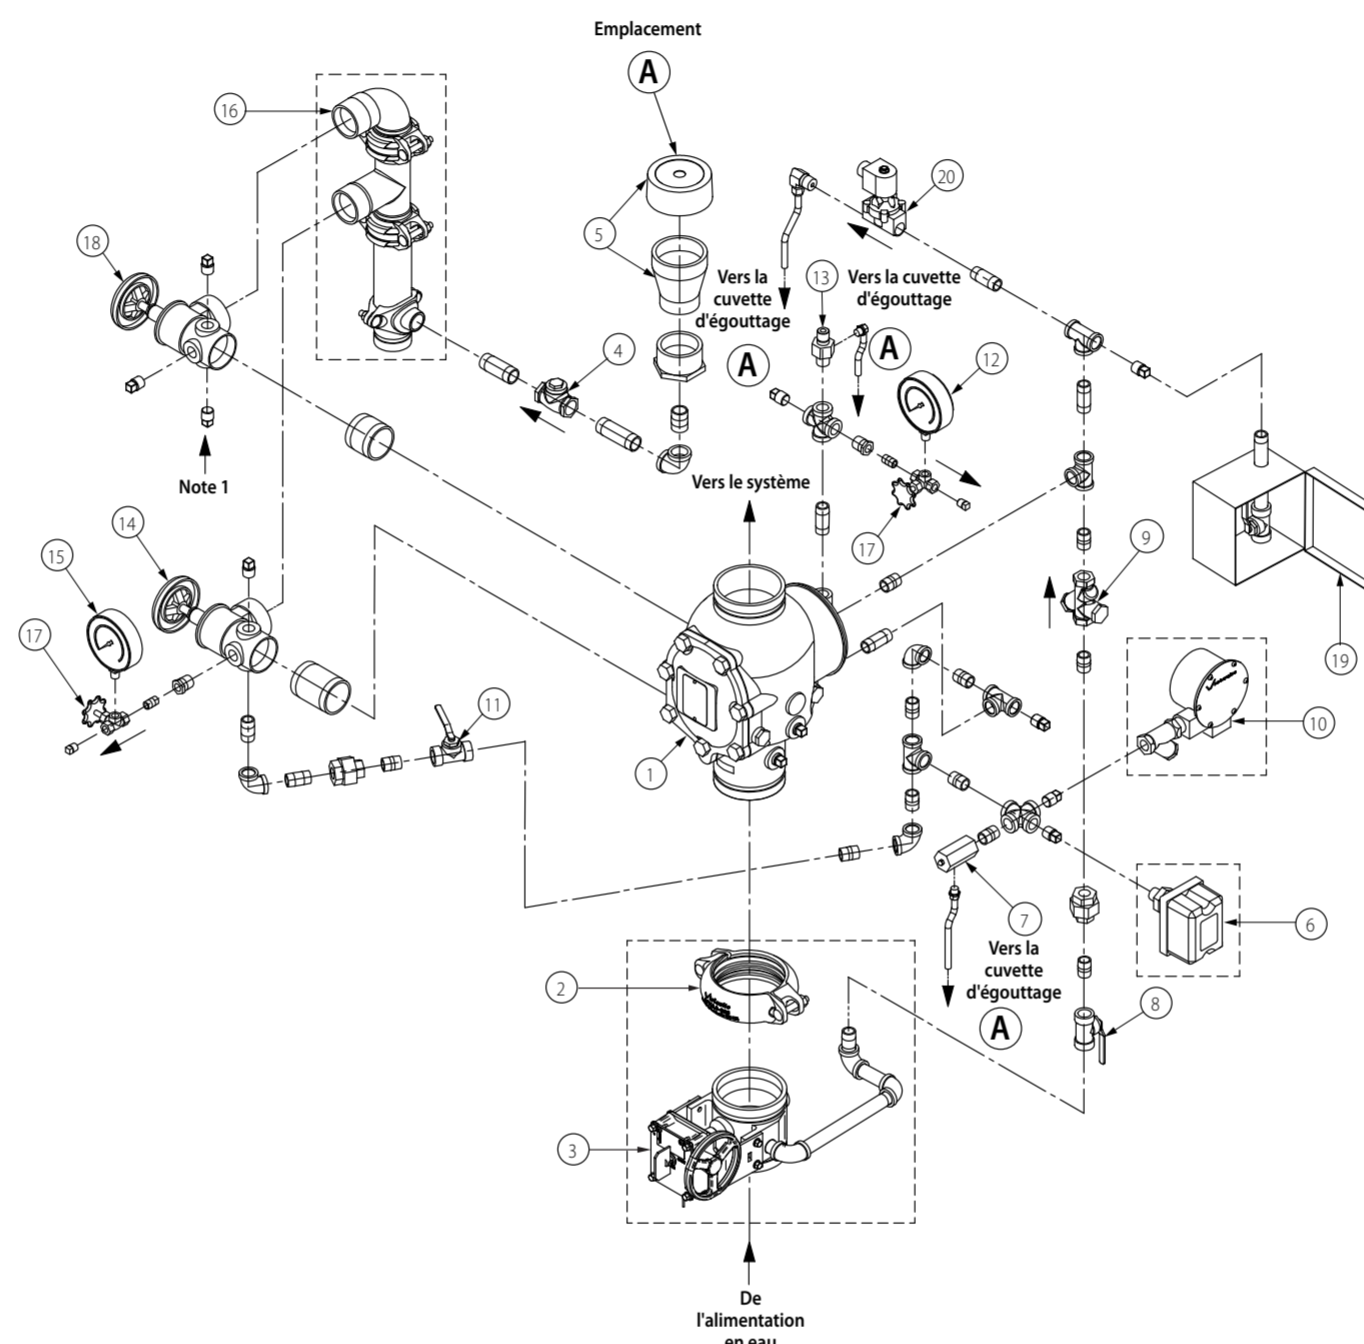

Repère	Description
1	Clapet déluge FireLock NXT série 769
2	Raccord mécanique rigide FireLock *
3	Robinet principal d'alimentation en eau *
4	Clapet de non-retour à battant sur vidange
5	Cuvette d'égouttage avec bouchon
6	Manostat d'alarme *
7	Clapet de non-retour d'égouttage série 729
8	Robinet à tournant sphérique sur conduite de mise en charge de membrane (Normalement ouvert)
9	Ensemble 3 en 1 filtre/clapet de non-retour/restricteur
10	Moteur hydraulique d'alarme série 760 **
11	Robinet à tournant sphérique pour essai d'alarme (normalement fermé)
12	Manomètre sur conduite de mise en charge de membrane (0 à 300 psi/0 à 20,7 bar)
13	Robinet de vidange automatique série 749

Repère	Description
14	Robinet de vidange principal sur alimentation en eau - Essai d'écoulement
15	Manomètre sur alimentation en eau (0 à 300 psi/0 à 20,7 bar)
16	Nécessaire de raccordement de vidange *
17	Robinet d'isolement de manomètre
18	Robinet de vidange principal du système
19	Avertisseur d'incendie série 755
20	Électrovanne série 753-E

* En option/vendu séparément - standard en cas de commande de la colonne montante Vic-Quick
 ** En option/vendu séparément

POSITION NORMALE DES ROBINETS EN SERVICE

Robinet	Position normale en service
Robinet à tournant sphérique sur conduite de mise en charge de membrane	Ouvert
Robinet à tournant sphérique pour essai d'alarme	Fermé
Robinet principal d'alimentation en eau	Ouvert
Robinet de vidange principal de la conduite d'alimentation en eau	Fermé
Robinet de vidange principal du système	Fermé

ESSAI D'ALARME D'ÉCOULEMENT D'EAU

Effectuer l'essai d'alarme d'écoulement d'eau à la fréquence exigée par les autorités locales compétentes. Vérifier ces exigences auprès des autorités compétentes dans la région concernée.

- Avertir les autorités compétentes, les personnes affectées au poste de surveillance d'alarme à distance et les personnes se trouvant dans la zone visée qu'un essai d'alarme d'écoulement d'eau va être effectué.
- Ouvrir à fond le robinet de vidange principal de la conduite d'alimentation en eau (repère 14), afin de rincer cette conduite et d'en éliminer les contaminants.
- Fermer le robinet de vidange principal de la conduite d'alimentation en eau (repère 14).
- Ouvrir le robinet à tournant sphérique pour essai d'alarme (repère 11). Vérifier que les alarmes mécaniques et électriques sont activées et que les postes de surveillance à distance (le cas échéant) reçoivent un signal d'alarme.
- Fermer le robinet à tournant sphérique d'essai d'alarme (repère 11), une fois la vérification du bon fonctionnement des alarmes terminée.
- Enfoncer le plongeur du clapet de non-retour d'égouttage (repère 7) pour vérifier qu'il n'y a pas de pression dans la conduite d'alarme.
- Vérifier que les alarmes se sont arrêtées de retentir, que la conduite d'alarme s'est correctement vidangée et que les alarmes dans les postes à distance se sont réarmées convenablement.
- Vérifier que la chambre intermédiaire du clapet ne fuit pas. Il ne doit pas y avoir de fuite par le clapet de non-retour d'égouttage (repère 7) sur la conduite d'alarme.
- Avertir les autorités compétentes, les personnes affectées au poste de surveillance d'alarme à distance et les personnes se trouvant dans la zone visée que le clapet a été remis en service.
- Fournir les résultats de l'essai aux autorités compétentes, le cas échéant.
